

EASY PROJECT
COLLABORATION

KOPPELING ED CONTROLS MET KYP PROJECT

Versie 1.1

POWERED BY
Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY



Inleiding

Deze handleiding beschrijft de koppeling tussen het planningsprogramma KYP Project en Ed Controls. De koppeling verbindt audits uit Ed Controls met het planningsonderdeel post-it van KYP Project. Zo worden audits die gereed zijn automatisch afgemeld in de betreffende post-it van KYP Project. En vice versa.

Basisstappen koppeling van audits vanuit Ed Controls naar KYP Project

Hieronder worden de volgende stappen beschreven om beide systemen met elkaar te koppelen, de informatie uit te wisselen en hoe de audits of post-its gereed te melden.

Stap 1: Koppeling Ed Controls en KYP Project tot stand brengen


De gebruiker moet in beide programma's een account te hebben. Ook moet het supportteam of accountmanager van Ed Controls op de hoogte zijn gebracht van de gewenste koppeling. Zo kunnen wij de benodigde module activeren in onze 'back-end'.

Ons supportteam of uw accountmanager moet weten wat de exacte naam is van het project in KYP Project. Wij checken of u de correcte juiste licentie heeft en maken de koppeling in orde. De naam van het project in KYP Project is hoofdlettergevoelig. Wees dus nauwkeurig in het doorgeven van de naam.

Let op: De koppeling wordt pas gerealiseerd zodra de eerste audits van Ed Control's naar KYP Project worden verplaatst. Op dat moment zal je met jouw KYP Project-gegevens moeten inloggen en wordt daadwerkelijk de verbinding tussen de beide projecten tot stand gebracht. Dat wordt verderop toegelicht in deze handleiding (Zie stap 4).

Stap 2: Opbouwen planning in KYP Project

De koppeling van Ed Control naar KYP Project is zo gebouwd dat de audits kunnen worden gekoppeld aan het planningsitem in KYP Project. Dat betekent dat je eerst een planning moet bouwen in KYP Project van de werkzaamheden die nodig zijn om een project te realiseren. Zie ook de afbeelding waarin je als voorbeeld de volgende planningsitems ziet: Afplakken/ afdekken, Sloopwerkzaamheden, et cetera.

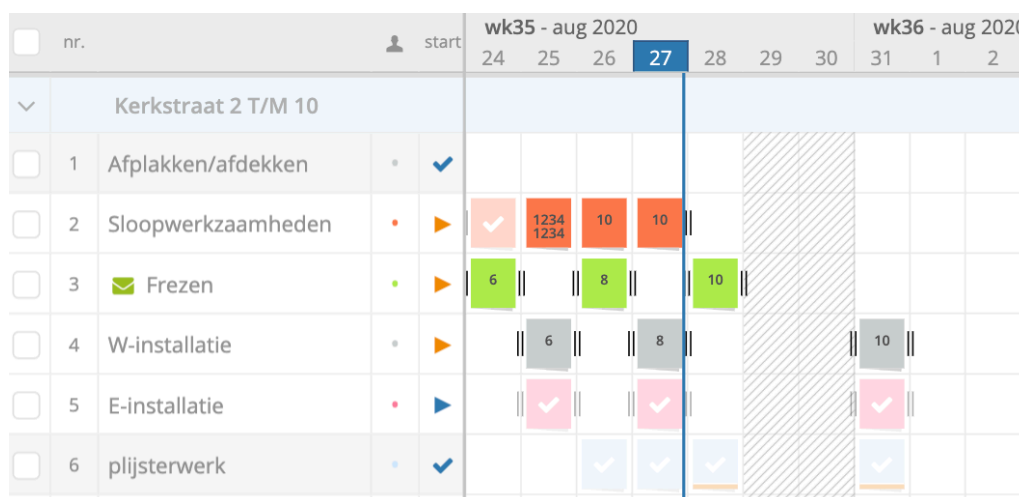

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Door eerst de planning in KYP Project te bouwen, kun je daarna ook audits kunt koppelen aan een specifieke regel op jouw planning. Je hoeft dan geen nieuwe regels toe te voegen en zo de planningslijst onnodig lang maken.

Deze planningsitems zijn vaak ook gekoppeld aan een 'Uitvoerende'. Zo is Robert Greidanus hierbij de Uitvoerende van het planningsitem 'Sloopwerkzaamheden'.

The screenshot shows the KYP Project software interface. On the left, there is a task list for 'Kerkstraat 2 T/M 10'. The tasks are:

nr.	start	stop	status	toegewezen aan
1			✓	
2			✓	
3			6	
4			6	
5				
6				
7			1	

The right side shows a detailed view of the selected task 'Sloopwerkzaamheden'. The responsible person is 'Robert Greidanus (Dig...)' and the type is 'Uitvoerende'. The start date is '07/08/2020', the duration is '15 dagen', and the end date is '27/08/2020'. The progress is '7/10 (70%)' and the hours are '0/0'. There are buttons for 'VERWIJDER', 'VOLTOOI', 'Annuleer', and 'OPSLAAN'.

Dat is relevant voor de Verantwoordelijke op audit-niveau in Ed Controls. De Verantwoordelijke uit KYP Project zal altijd de Verantwoordelijke in Ed Controls weergeven. Hierover later meer.

Stap 3: Klaarzetten van de audits in Ed Controls

In Ed Controls kun je op basis van zogenaamde templates vragenlijsten maken die horen bij bepaalde werkzaamheden. Dat kan via web.edcontrols.com of importeer ze uit andere projecten in Ed Controls. In zo'n template staan vragen die de werkzaamheden kunnen aantonen of controleren. Zo zou bij een wapeningstemplate de vragen gesteld kunnen worden: "zijn er voldoende staven zijn aangebracht?" of "zijn de staven op dikte?". Bij een opleveringsitem kunnen vragen zijn toegevoegd als "Is de bewoner tevreden?" en: "Zijn er opleverpunten?".

Nadat de template is gepubliceerd, kunnen er audits worden gestart voor de specifieke objecten. Zie ook de handleiding of de supportsite van Ed Controls.

Wanneer een audit gestart is, is het volgende hierin terug te vinden:

The screenshot shows the Ed Controls software interface. The left sidebar shows a list of templates, with '21-Wapening' selected. The main area shows the configuration for an audit titled '21-Wapening_Kavel 01'. The audit ID is '6FCE85' and the status is 'Gestart'. The responsible person is 'Robert Greidanus(edcontrols.com)'. The audit is configured for '31-aug-2020'. There are buttons for 'Opslaan', 'Annuleren', and 'Volgende'.

POWERED BY


Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY


In een audit wordt:

- > De titel is aangepast voor het specifieke object. In het voorbeeld: "21 Wapening_Kavel 01".
- > Een datum wanneer het gerealiseerd moet zijn toegevoegd. In het voorbeeld 31-8-20..
- > Een verantwoordelijke toegevoegd. In het voorbeeld robert@....
- > Vervolgens wordt de audit opgeslagen en heeft het een uniek nummer. In het voorbeeld 6FCE85.
- > Ook is er al een tekening opgeslagen. Dat kan later en buiten op de project-locatie ook.

Stap 4: Koppelen van de audit aan een post-it in KYP Project

In Ed Controls kun je een specifieke audit of meerdere audits in één keer koppelen aan een planningsitem in KYP Project. Dit kan alleen via web.edcontrols.com. Je selecteert de specifieke audit en filtert eventueel op de specifieke verantwoordelijke.


Vervolgens klik je op de printknop  in Ed Controls. Het print-venster opent zich:

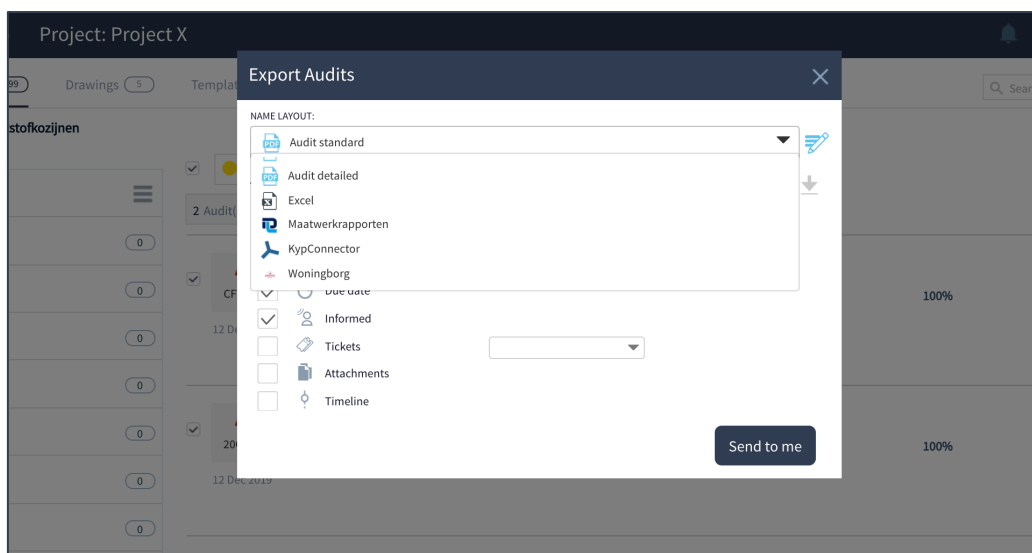

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Boven in dit geopende venster zie je een pull down-menu. Je opent dit menu en de KYP Project-connector verschijnt. (Verschijnt dit niet? Neem dan contact op met je accountmanager. Het kan zijn dat de module niet geactiveerd is.)

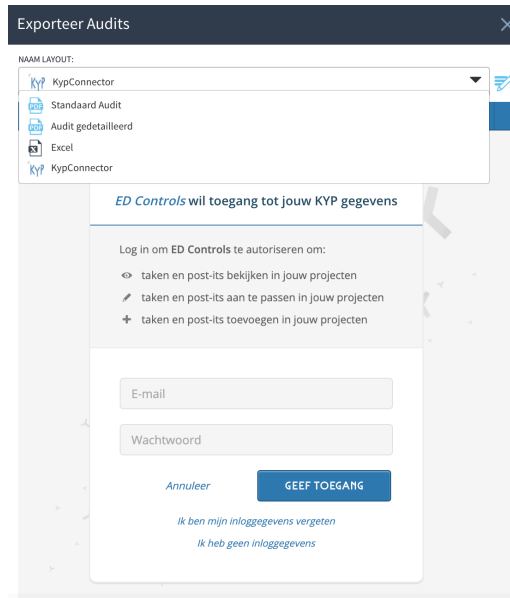

Je klikt op de KYP Project-connector. Is het de eerste keer? Log dan eerst in bij KYP Project.

Let op: Dit is het moment waarop je daadwerkelijk de verbinding met het KYP Project-project tot stand brengt!

In het venster opent zicht de mogelijkheid om in te loggen met je KYP Project-inloggegevens. Aangezien je bij de projectinstellingen de exacte naam van het KYP Project-project hebt geplaatst, zal er vervolgens een koppeling tot stand zijn gebracht.

Vervolgens zal de planning verschijnen, met de uitvoerende die voor deze planningsactiviteit verantwoordelijk is. Dat ziet er als volgt uit, zie afbeelding.

Exporteer Audits


NAAM LAYOUT:
KypConnector

Klik hieronder op een activiteit om een audit toe te voegen aan een activiteit in Kyp


Search Activity

28	Schoonmaak	support@kyp.nl
29	Schoonmaak	support@kyp.nl
30	Schoonmaak	support@kyp.nl
31	Schoonmaak	support@kyp.nl
32	Schoonmaak	support@kyp.nl
33	Schoonmaak	support@kyp.nl
34	test task	kornienko.sasha@gmail.com
35	Wapening	r.greidanus@edcontrols.com

Je ziet hier ook staan “Wapening” met als Verantwoordelijke ‘r.greidanus@edcontrols.com’
Je selecteert het juiste planningsitem en de audits worden gekoppeld in KYP Project.



Een pop-up, recht onderin, zal verschijnen dat de transfer succesvol is geweest en ook bovenin het scherm is zichtbaar dat de transfer van de audits succesvol is uitgevoerd:



De audits zijn, nadat je de pagina in KYP Project hebt ververs nu ook zichtbaar in KYP Project. Zie ook de afbeelding hieronder:

>	≡	Test			
<input type="checkbox"/>	35	Wapening	•	2	
+ taak					

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Wat is nu weergegeven in KYP Project?

In KYP Project zie je nu op de lijn van de bewuste planning-item op de specifieke dag nu n of meerdere post-its verschijnen. In KYP Project is er 1 post-it per dag beschikbaar, op 31 augustus. Je kan op deze post-it klikken en de volgende informatie verschijnt:

The screenshot shows a mobile interface for a project task. At the top, it displays the date '31 AUG 2020' and the task name 'Wapening - Uitvoerende' by 'Robert Greidanus - DigitaalOplever...'. There are buttons for 'Voltooid' and 'Mijlpaal'. Below this, there are fields for 'LEVERANCIERS:' (Shop voor materialen) and 'LOCATIE:' (Voorbeeld, Voorbeeld, Woning ID). There are also fields for 'AANTAL:' (Geschat, Gewerkt) and 'TIJD:' (UU:MM, 24h formaat). At the bottom, there is a text field showing 'Audit ID : 6fce85 | Audit Name : 21-Wapening_Kavel 01' and three buttons: 'VERWIJDER', 'Annuleer', and 'OPSLAAN'.

- > Je ziet de datum: 31 augustus
- > De Uitvoerende
- > En je ziet ook de omschrijving over deze of eventueel meerdere specifieke audits: "Audit ID : 6fce85 | Audit Name : 21-Wapening_Kavel 01".

De audit uit Ed Controls is nu gekoppeld aan KYP Project!

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Gereed melden audits in Ed Controls of Voltooien post-its in KYP Project

Het is mogelijk om audits in Ed Controls 'gereed' te melden en daarmee de post-it in KYP Project te voltooien. En andersom: de post-it in KYP Project te voltooien en daarmee ook een melding in de audit te geven.

Beide situaties worden hier beschreven:

Gereed melden audit in Ed Controls

Als de audit in Ed Controls volledig is ingevuld, kan de audit gereed worden gemeld in Ed Controls. Binnen afzienbare tijd zal ook de betreffende post-it in KYP Project zijn Voltooid. Zie hieronder de Gereed gemelde audit en taak:

31 AUG 2020 Voltooid

Wapening - Uitvoerende
Robert Greidanus - DigitaalOplever... Mijlpaal
Afgewinkt op 28 augustus 2020 door Robert Greidanus

LEVERANCIERS: Shop voor materialen

LOCATIE:

01	Voorbeeld	01
----	-----------	----

AANTAL: Geschat Gewerkt

TIJD: UJJ:MM (24h formaat)

Audit ID : 6fCE85 | Audit Name : 21-Wapening_Kavel 01

VERWIJDER Annuleer OPSLAAN

<input type="checkbox"/>	■	21-Wapening_Kavel 01	🕒 31-Aug-2020
<input type="checkbox"/>	6FCE85	👤 Robert Greidanus (edcontrols.com)	🕒 27-Aug-2020
	20 seconden geleden	👤 WP EC 14-06-2019	

Voltooien post-it in KYP Project

Het kan zijn dat dat de taak in KYP Project eerder wordt voltooid dan dat de audit in Ed Controls ook daadwerkelijk is ingevuld en Gereed is gemeld. Op zich is dat een bijzondere situatie, maar dat kan gebeuren. Er wordt dan wel een indicatie gegeven in de audit van Ed Controls, ondanks dat deze dus niet volledig is ingevuld en dus Gereed is (0%).

Dat ziet er als volgt uit:

<input type="checkbox"/>	●	21-Wapening_Kavel 02 [Afgerond in KYP]	🕒 27-Aug-2020	0%
	B56A42	👤 --		
	13 seconden geleden			

Je ziet hier de opmerking: 'Afgerond in KYP Project' verschijnen. **Let op:** deze opmerking wordt niet getoond als de audit wordt ingevuld, deze Gereed wordt gemeld en dus automatisch de taak in KYP Project is voltooid.

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Specifieke situaties

Hieronder enkele specifieke situaties die zich kunnen voordoen:

Datum van de audit & post-it

Er zijn twee situaties voor wat betreft de datum:

1. Geen datum in de audit van Ed Controls benoemd; De post-it wordt nu weergegeven op de dag waarop de audits zijn verplaatst naar KYP Project. Je kan de post-it vervolgens verplaatsen naar de goede datum. Automatisch zal na enige tijd de datum ook verschijnen in de audit. De KYP Project-datum is daarin leidend en zal ook worden weergegeven in de audit van Ed Controls.
2. Wel een datum in de audit van Ed Controls benoemd: de post-it wordt dan op die specifieke dag in KYP Project weergegeven.

AANTAL:	<input type="button" value="Geschat"/>	<input type="button" value="Gewerkt"/>
TIJD:	<input type="text" value="UU:MM"/>	(24h formaat)
<input type="text" value="Audit ID : 6fce85 Audit Name : 21-Wapening_Kavel"/> <input type="text" value="01_Audit_ID : 320e45 Audit Name : 21-Wapening_Kavel 05"/>		
<input type="button" value="VERWIJDER"/> <input type="button" value="Annuleer"/> <input type="button" value="OPSLAAN"/>		

Wordt de datum in KYP Project aangepast, dan zal deze datum ook verschijnen in de datum van de specifieke audit.

Meerdere audits op 1 dag

In het geval van meerdere audits op één dag wordt er dus maar één post-it geplaatst op de specifieke datum. In deze post-it worden meerdere audits benoemd. Je kan namelijk maar één post-it voor een planningstaak in KYP Project één dag plaatsen. En dus niet voor elke afzonderlijke audit een post-it op diezelfde dag.

Aangezien we een maximaal aantal karakters kunnen gebruiken in de post-it, zullen niet alle audits worden benoemd. Er zal dan worden verwezen naar web.edcontrols.com. Daar worden wel alle audits getoond.

De post-it in KYP Project wordt overigens pas op Voltooid gezet als alle audits in Ed Controls Gereed zijn gemeld. Indien de taak in KYP Project op Voltooid wordt gezet, worden wel al deze specifieke audits in Ed Controls voorzien van de opmerking 'Afgerond in KYP Project'.

Verantwoordelijke of uitvoerende voor een audit

In Ed Controls kun je de uitvoerder of een onderaannemer Verantwoordelijke maken voor een audit. In KYP Project kan aan een planningsitem een Uitvoerde worden gekoppeld.

Let op: Het e-mailadres in KYP Project is bepalend. Dat betekent dat als het e-mailadres in KYP Project anders is dan het e-mailadres in de audit van Ed Controls, het e-mailadres in KYP Project het e-mailadres in Ed Controls zal vervangen.

Het is niet mogelijk een e-mailadres te koppelen aan de audit in Ed Controls. Dan zal dus het e-mailadres van de taak in KYP Project worden overgenomen en in de audit worden gezet. De audit krijgt dan dus ook de status Gestart (rood driehoekje).

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Zie afbeelding:




Overigens kun je bij de transfer van de audits naar KYP Project kiezen voor de taak met het correcte e-mailadres. Dan zou het dus al goed moeten zijn gekoppeld aan het juiste e-mailadres. Je hebt immers zelf de keuze gemaakt voor de taak en het e-mailadres.

Gereed melden van een post-it in KYP Project; audit is nog niet uitgevoerd in Ed Controls

In KYP Project kun je de post-it's voltooien. Je meldt de taak af door op 'Voltooid' te klikken. Het kan zijn dat de audit in Ed Controls nog niet is uitgevoerd. In dat geval geven wij in de titel van de audit het volgende weer: 'Afgerond in KYP Project'.

Je kan alsnog de audit uitvoeren in Ed Controls, maar de status van de post-it in KYP Project blijft "Voltooid". Zie ook de afbeeldingen:



31 AUG 2020 ✓ Voltooid

Wapening - Uitvoerende Mijlpaal

Robert Greidanus - DigitaalOplever...
Afgevinkt op 28 augustus 2020 door Robert Greidanus

LEVERANCIERS:

LOCATIE:

01	Voorbeeld	01
----	-----------	----

AANTAL:

TIJD: (24h formaat)

Audit ID : 6fce85 | Audit Name : 21-Wapening_Kavel 01

VERWIJDER Annuleer OPSLAAN

POWERED BY

Dutchview
INFORMATION TECHNOLOGY

Gereed melden van de audits in Ed Controls; taak niet voltooid in KYP Project

Als de audits zijn verplaatst naar een taak in KYP Project, dan zijn beide met elkaar verbonden. Op het moment dat de audit in Ed Controls Gereed is gemeld, dus is voorzien van informatie, ondertekend en afgesloten, dan wordt de taak ook afgemeld in KYP Project. De taak wordt op Voltooid gezet.

AANTAL:

TIJD: (24h formaat)

Audit ID : 6fce85 | | Audit Name : 21-Wapening_Kavel
01 Audit ID : 320e451 | | Audit Name : 21-Wapening_Kavel.05

Annuleer

Indien er meerdere audits voor 1 dag zijn ingepland, dan is er, zoals nu bekend, maar 1 post-it in KYP Project. Als alle audits in Ed Controls nu zijn Gereed gemeld, dan wordt pas de taak in KYP Project Gereed gemeld.

Verplaatsen van de datum van de post-it in KYP Project.

Als de audit een bepaalde einddatum kent, dan zal hij, zoals aangegeven ook naar de specifieke datum in KYP Project worden verplaatst. Indien de datum vervolgens in KYP Project wordt aangepast, dan zal ook de datum in Ed Controls worden aangepast.

Aanpassen van de datum in Ed Controls

Als de datum van de audit wordt aangepast in Ed Controls dan zal de datum niet worden verplaatst in KYP Project. De audit behoudt op dat moment de originele datum. Andersom is het dus wel zo, zoals in het vorige punt is beschreven.

Hoe snel gaat de uitwisseling van data?

Als er in het ene programma een wijziging wordt gemaakt, is die binnen een minuut zichtbaar in het andere programma. Dit komt doordat er gestructureerde checks zijn in de programma's die kijken of er wijzigingen zijn, en deze dan vervolgens overzetten. Natuurlijk moet je met je tablet of smartphone online zijn om deze wijzigingen ook daadwerkelijk te zien in de app van Ed Controls.

21-Wapening_Kavel 01

6FCE85 Robert Greidanus (edcontrols.com) 31-Aug-2020

20 27-Aug-2020

seconden WP EC 14-06-2019

geleden

POWERED BY

Dutchview[®]
INFORMATION TECHNOLOGY
